



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número CFF/19-02019208

Programa: SE.-URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 19/05061 CP
Descripción de la Obra: Pavimento Hidráulico En C. Romelias
Ubicación: Entre Valle Verde Y Paseo De La Ferrería
Colonia: Valle Verde Sur

Fecha Real de Inicio: 18/05/2019

Fecha Real de Terminación: 03/08/2019

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1,132

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatat	Municipal	Beneficiarios
R33-013/19	19/02/19	\$903,583	\$777,081	\$0	\$0	\$126,502

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 1,132.13

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatat	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2019	\$883,486.24	\$759,797.80	\$0	\$0	\$123,688.44

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías comunitaria. Escarificación y excavación en material tipo "b" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. Promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. Escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 cms compactos. Sub-base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor con un espesor de 20 cm compactos. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 20 cm compactos. Pavimento 15 cm riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor promedio, con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr/cm2, colocado continuo, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías con disco tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor en acabado estampado del sistema (tipo modelo increte) en colado continuo, incluye: cimbra metálica, corte con disco de la junta fría, extendido con regla vibratoria, moldes, desmoldante y mano de obra suministro de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr. / m³ sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta. Obra complementaria aplicación de pintura vinilica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye: preparación de la superficie. Renivelación de pozo de visita tipo común de 70 cms. De altura con muro de tabique de barro rojo recocido de 28 cms. De espesor asentado con mortero cem-arena 1:5 aplanado pulido en interior de 2.5 cms. Suministro y colocación de brocal de fo.fo. Para trafico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2013-2016 para pozos de visita incluye: colocado y m. De o. Atípico reubicación de poste de baja tensión de arroyo, incluye instalación de retenida tipo rsa




DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

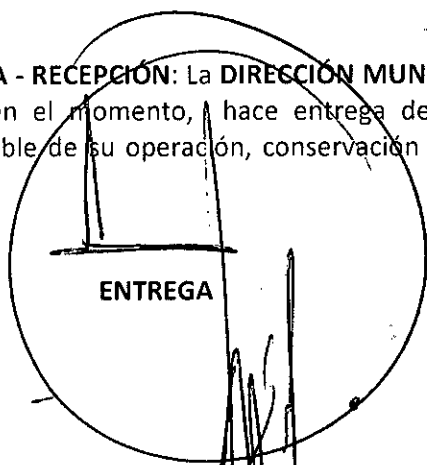

ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUINONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

