

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-29

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE210009 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ALACRAN ✓

Ubicación:

Colonia: COL. EL ALACRÁN ✓



Fecha Real de Inicio: 27/09/2021 ✓ Fecha Real de Terminación: 15/12/2021 ✓

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1. ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0567	2 de julio de 2021	\$1,063,965.6	\$1,063,965.6	\$0	\$ .0	\$ .0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021 ✓	\$1,044,240.86	\$1,044,240.86	\$0	\$ .0	\$ .0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Cancha de futbol. Retiro de pasto en mal estado, incluye acarreo dentro y fuera de la obra, recuperación y almacenaje del pasto en la planta de maniobras de opm. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 45 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena silica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Desmontaje de malla ciclónica, retiro, carga y acarreo a almacén municipal.. "suministro y colocación de malla ciclónica de 55 mm x 55 mm abertura de rombo, cal 10.5, soldada a solera de 3/4" x 3/16" con fondo anticorrosivo acabado en esmalte alquídico. A 2 capas incluye cortes, desperdicios, acarreo, material, mano de obra, equipo y herramienta." pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. "pintura esmalte marca berel y/o similar alquídico, en estructura metálica, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con máquina de aspersión, incluye; protección con hule negro, limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra." imagen institucional "suministro y colocación de lona de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas." alumbrado suministro y colocación de fotocelda incluye: materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de tubo lámpara led 18 w t8 de 120 cm luz blanco frío, cuerpo de cristal. Suministro y colocación de luminaria nashira ii modelo 15ptlledc30m vb marca tecnolite incluye fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. Suministro y colocación de interruptor termomagnético principal tipo hdl 36070, incluye: conexión y pruebas. Suministro y colocación de contacto dúplex polarizado línea modus mx color blanco, incluye placa, pijas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de dos apagadores sencillos empotrado en muro línea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de apagador sencillo línea modus color blanco, incluye placa, cables, junta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Extraordinarios. Cableado para salida de luminaria, 2 contactos y apagador en caseta de vigilancia. Incluye: cable, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para instalación. Preparación de base para recibir pasto sintético en cancha deportiva. Incluye: deshierbe, limpieza de terreno, relleno y compactación con medios mecánicos manuales de base hidráulica, nivelación, riego de impregnación a razón de 1.50 l/m2, poreo, barrido de superficie, carga

y retiro de despericio, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Rotulo "deportivo "el alacrán"". De medida: 1.50 mts x 1.50 mts, y texto de 2.5 mts de longitud y 50 cm de altura y pintura de fondo obscuro incluye: pintura a dos manos, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su instalacion. Suministro y colocación de un modulo de juego metalico con 3 columpios. Incluye: dados de cimentación, estructura metalica, pintura, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. Reparación de juego metalico que consta de remodelacion de columpios, resbaladilla, y sube y baja, que incluye: perfil de ptr cal 14, reposicion de cadenas, reparacion de escalera con tubo de 1", resoldado de estructura, fondo y pintura esmalte, fabricacion de 5 dados de cimentacion de 30x30x60cm y anclaje de estructura a dados de cimentacion. Incluye: materiales, mano de obra, pintura, y todo lo necesario para su correcta instalacion. Resanes en muros de cancha. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Reparación de puerta de acceso a cancha, que incluye: retiro de puerta, limpieza de perfiles, colocacion de bisagras, colocacion de puerta, instalacion de pasador, nivelado, soldadura, pulido y todo lo necesario par asu correcta instalacion. Cableado y conexion para 2 postes de alumbrado publico. Incluye: cable urd triplex cal 6, conectores cilindricos aislados, conectores de compresión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactor de 40 amp. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de interruptor termomagnetico de 2x40 amp. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de reloj digital con respaldo de bateria tork incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de brazo de 30 cm para arbotante de 30 cm con placa perforada para atornilla en percha de arbotante. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Reacomodo de malla ciclonica existente en laterales de cancha de futbol, consiste en soldar soleras, tensar malla ciclonica existente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de luminaria sola basic de 70 watts, modelo sola led city plus de led de 70 w sin base para fotocelda incluye: retiro de luminaria existente en caso de ser necesario, materiales, herramientas y mano de obra. Retiro de tierra y escombros, producto del retiro del pasto, limpieza de areas de jardines y andadores, incluye: acarreo con carretilla al exterior de la obra, carga y acarreo en camion.



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

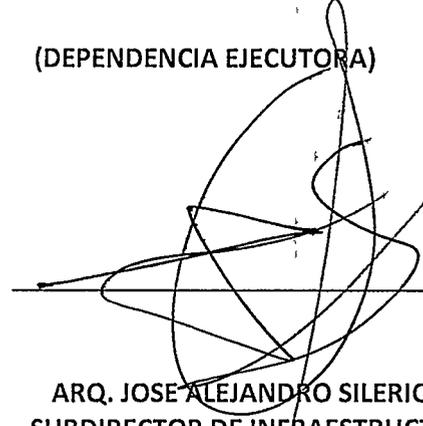
RECIBE

  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CÁSAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN PAREDES MIRANDA  
Juan. Paredes M.

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION



**OBRAS PÚBLICAS**  
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

