

OPERADO

2022

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-20

Programa: SC.- AGUA POTABLE ✓

Subprograma: 03.- CONSTRUCCIÓN ✓

Clave de la Obra: SC220004 ✓

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CIRCUITO NIÑOS HEROES 2

Ubicación:

Colonia: COL. JOSÉ REVUELTAS ✓

Fecha Real de Inicio: 07/07/2022 ✓

Fecha Real de Terminación: 25/07/2022 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1.

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0738 ✓	11 de abril de 2022 ✓	\$284,703.43 ✓	\$284,703.43 ✓	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022 ✓	\$279,277.22 ✓	\$279,277.22 ✓	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpieza trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad, incluye: afine de plantilla. Suministro y colocación de plantilla de material triturado de 1" a 10cms de espesor no compactada. Suministro y colocación de tubería p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx215 l.a.b. fabrica de 12" de diámetro. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms con material producto de la estación al 90% de la prueba proctor modificada, incluye mano de obra y herramientas. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad, incluye: afine de plantilla. Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 7 cms de espesor t.m.a. 1 1/2". Parrilla hecha a base de acero numero 4 fy=4200, @ 15cms., incluye ganchos, dobleces, silletas, separadores y habilitado. Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de 25 cms de espesor de concreto de 250 kg/cm2 con cortadora. Cimbra aparente en losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye habilitado, armado, cimbrado y descimbrado. Concreto f'c= 250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" hecho en obra incluye colado y vibrado. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad, incluye: afine de plantilla. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 3.00 a 6.00 mts. De profundidad, con afloje y extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes de remoción, carga al camión o a un lado de la zanja a 10.00 mts. Del eje de la misma conservación de la excavación hasta instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes. Suministro y colocación de piedra bola de 1 1/2 a 3", 50 cms de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 5-12", 4.2 mts de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 2", 92 cms de espesor. Suministro y colocación de gravilla de 1", 38 cms de espesor. Suministro y colocación de codo de 90° de pvc de 12". Suministro y colocación de tee de 90° de pvc de 12". Concreto en pavimento de 25 cms de espesor, concreto f'c= 250kg/cm2 acabado rayado. Acarreo de material producto de la excavación con camión de volteo, primer kilómetro, incluye: carga con equipo mecánico. Acarreo de material producto de la excavación con camión de volteo. Kilometro subsecuente. Refuerzo de concreto f'c=250 kg/cm2, con fibra micro sintética monofilamento de 600 gr color blanco masterfiber m 60, sistema de refuerzo de fibras 100% de copolímero virgen de alta tenacidad que brinda gran resistencia al impacto y fuerza residual, superior a fibras metálicas. Suministro y colocación de rejilla de caja de captación de 2.18x2.18 mts, marco a base de Angulo de 1/4x4", contramarco de canal de 4" con rejilla de canal de 4" a cada 0.09 centímetros y solera de 1/4x2" a cada 51 cms en sentido longitudinal. Incluye material, acarreo, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Demolición de concreto en pavimento hidráulico de 17 a 18 cms de espesor, por medios mecánicos, incluye maquinaria, mano de obra y equipo menor, carga y acarreo de material no util fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Limpieza general de obra.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS

RECIBE

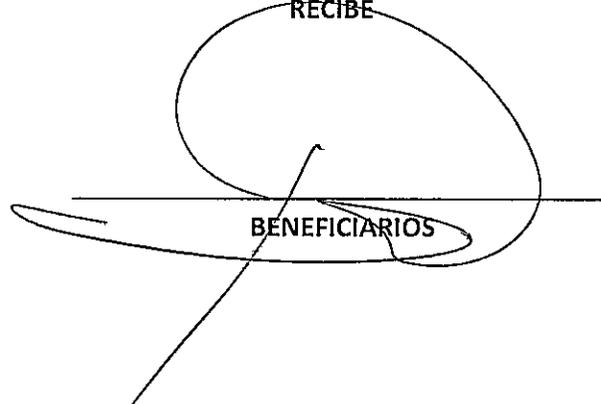

BENEFICIARIOS



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____



[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*
