



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-101

Programa: SD.-ALCANTARILLADO Y DRENAJE

Subprograma: 01.-REHABILITACIÓN

Clave de la Obra: SD230023 CP

Descripción de la Obra: DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS,

Ubicación: ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES

Colonia: COL. VALLE VERDE

Fecha Real de Inicio: 14/08/2023

Fecha Real de Terminación: 17/10/2023

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad DESC. Cantidad: 65.00

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Rows include NO. 2023-R33-FAISM-A-0965 and 2023-R33-FAISM-AM-1028.

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad DESC. Cantidad: 60.00

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row includes Ejercido for 2023.

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Descargas Domiciliarias. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diámetro, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano.... Descarga domiciliaria (sin banquetta) en material "B" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de p.v. c. sanitario (de 0.00 a 8.00 metros de longitud) de 6" de diámetro y suministro de todos los materiales indicados por plano. Incluye conexión a TEE/YEE existente en la línea de drenaje principal. Descarga domiciliaria (sin banquetta) en material "B", por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de P.V.C. sanitario (de 0.00 a 8.00 metros de longitud) de 6" de diámetro y suministro de todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal con muros de tabique 14 centímetros, aplanados con mortero cemento - arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro.... Incremento por cada 0.50 metros de profundidad. Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Dirección Municipal de Obras Públicas. Registro para alcantarilla pluvial de medida en interiores de 1.20x1.20 metros con profundidad de 1.50 metros de ladrillo rojo recocado de 7x14x28 centímetros juntado con cemento-arena prop. 1:4, acabado interior aplanado y pulido con cemento-arena prop. 1:4, plantilla de concreto pobre F'c=100 kg/cm2 de 7 cm de espesor y plantilla de desplante de concreto F'c=150 kg/cm2 de 7 cm de espesor relleno con arena hasta nivel de tubo para control de asolves. Incluye suministro y colocación de rejilla de solera de 3/16" x 2" @4cm cada una en un solo sentido con refuerzo de solera en la parte superior en sentido transversal, marco de angulo de 3/16" x 2 1/2" anclado con varilla de 3/8", tuvo de PVC de 200 milímetros (8") de diámetro serie 20 conectado a pozo de visita existente. Registro sanitario de .40x.60x.50 metros de profundidad con tabique rojo recocado de 12x14x7 cm, juntado con cemento - arena prop. 1:4, aplanado interior con cemento-arena prop.1:4, marco y contramarco de ángulo metálico de 3/16" x 2", tapa vaciada con concreto F'c= 200 kg/cm2 reforzado con parrilla de varilla #3 @15cm en ambos sentidos, anclas de varilla #3 sujetas a cadena de concreto F'c=150 kg/cm2 de 15x15 armada con


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento,


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

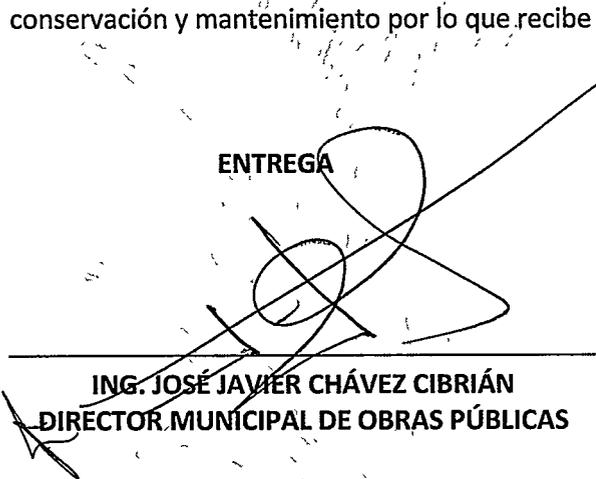

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

